


Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Peso	Término	% concluída	Predecessoras
1		BR-UTM	2173 dias	Seg 04/09/23	100	Qua 31/12/31	0%	
2		01 - Iniciação	7 dias	Seg 04/09/23	10	Ter 12/09/23	0%	
3		Elaborar Termo de Abertura do Projeto - SIGA	5 dias	Seg 04/09/23	5	Sex 08/09/23	0%	
4		Criar projeto no SIGA	2 dias	Seg 11/09/23	5	Ter 12/09/23	0%	3
5		02 - Planejamento	15 dias	Qua 13/09/23	20	Ter 03/10/23	0%	
6		Elaborar plano do projeto	15 dias	Qua 13/09/23	10	Ter 03/10/23	0%	4
7		Elaborar Cronograma - Project	15 dias	Qua 13/09/23	5	Ter 03/10/23	0%	6II
8		Mapear Riscos do Projeto - Mapa de Riscos	15 dias	Qua 13/09/23	5	Ter 03/10/23	0%	6II
9		03- Execução	2063 dias	Seg 04/09/23	62	Qua 30/07/31	0%	
10		FASE 01	499 dias	Seg 04/09/23	42	Qui 31/07/25	0%	
11		Serviço de Descoberta e Sincronização	150 dias	Seg 04/09/23	6	Sex 29/03/24	0%	
12		Serviço de Gerenciamento de Restrição	65 dias	Seg 01/01/24	6	Sex 29/03/24	0%	11II+85 dias
13		Serviço de desconflito estratégico	87 dias	Seg 01/01/24	6	Ter 30/04/24	0%	12II
14		Processo de Onboarding	65 dias	Qua 01/05/24	6	Ter 30/07/24	0%	13
15		Serviço de Monitoramento de Conformidade	65 dias	Qua 01/05/24	6	Ter 30/07/24	0%	14II
16		Serviço de registro de eventos	151 dias	Seg 02/09/24	6	Seg 31/03/25	0%	15TI+23 dias
17		Serviço de identificação e registro	88 dias	Ter 01/04/25	6	Qui 31/07/25	0%	16
18		FASE 02	522 dias	Sex 01/08/25	20	Seg 02/08/27	0%	17
19		FASE 03	521 dias	Ter 03/08/27	0	Ter 31/07/29	0%	18
20		FASE 04	521 dias	Qua 01/08/29	0	Qua 30/07/31	0%	19
21		04 - Monitoramento e Controle	2063 dias	Seg 04/09/23	4	Qua 30/07/31	0%	
22		Elaborar Relatório de Acompanhamento do Projeto	2063 dias	Seg 04/09/23	2	Qua 30/07/31	0%	10II
23		Realizar Registro de Lições Aprendidas	2063 dias	Seg 04/09/23	2	Qua 30/07/31	0%	10II
24		05- Encerramento	110 dias	Qui 31/07/31	4	Qua 31/12/31	0%	
25		Aceite do produto final	40 dias	Qui 31/07/31	2	Qua 24/09/31	0%	23
26		Elaborar termo de encerramento do projeto	40 dias	Qui 25/09/31	2	Qua 19/11/31	0%	25
27		Encerrar projeto no SIGA	30 dias	Qui 20/11/31	0	Qua 31/12/31	0%	26

Projeto: CTI00104-04 - DESENVOLVER
Data: Seg 26/08/24

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento




Resumo do projeto



Data limite



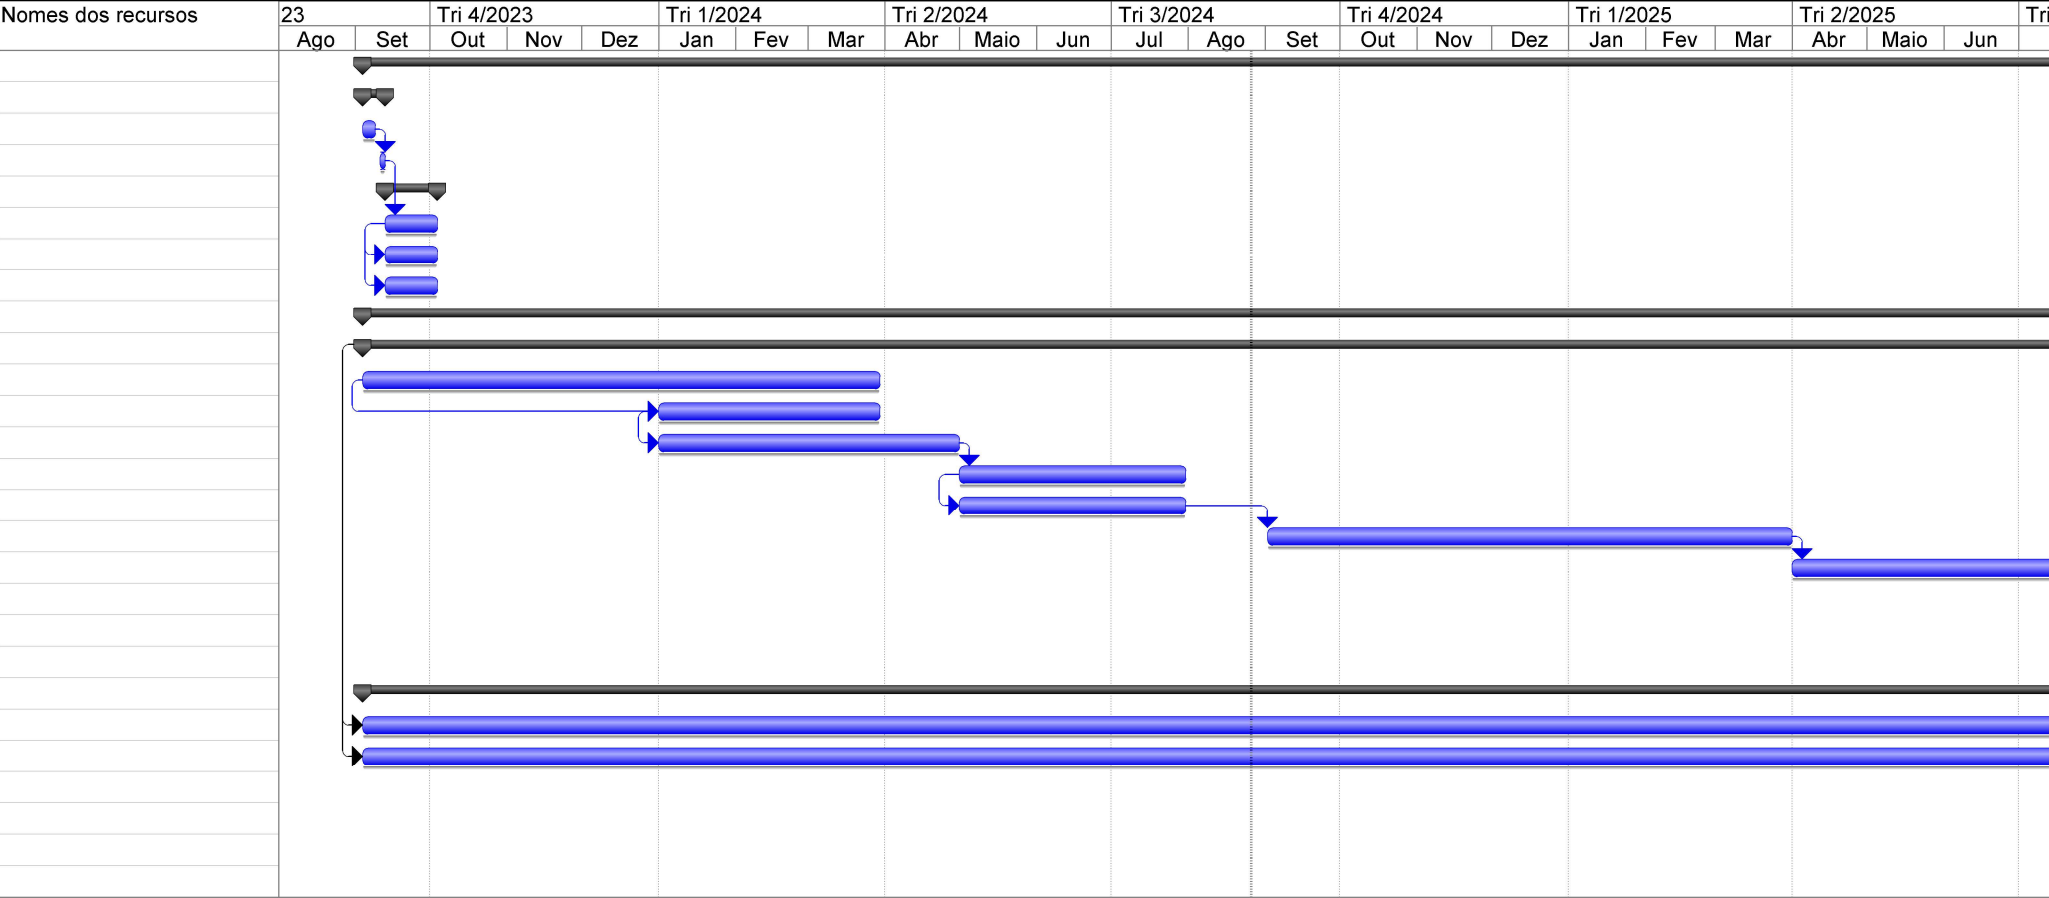



Projeto: CTI00104-04 - DESENVOLVI
Data: Seg 26/08/24


Tarefa

Divisão

Andamento










Etapa

Resumo

Resumo do projeto










Tarefas externas

Etapa externa

Data limite







Tri 3/2025			Tri 4/2025			Tri 1/2026			Tri 2/2026			Tri 3/2026			Tri 4/2026			Tri 1/2027			Tri 2/2027			Tri 3/2027		
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set

[illegible]

